

Job name: สุ่มตรวจแอลกอฮอล์ ของทีมงานก่อนเริ่มงาน

Description:

- ก่อนเริ่มงานจะทำเป่าแอลกอฮอล์ของทีมงานทุกคน เพื่อตรวจสอบความพร้อมก่อนเริ่มเข้าปฏิบัติงาน

Picture



Remark:

Date: 10.9.2023



OVS Daily Report



One Volts Service Co.,Ltd.
9/230 Soi Watcharapol 3 Intersection 3
Sub-district Klong Thanon District Sai Mai
Bangkok 10220 Tel:089-488-1651

Job name: เปิดไมงาน Actuator IDF 1A

Description:

- ประสานงานกับทาง Operator
- เปิด Permit to work Hot Work
- ตัดระบบ แขนง Tag Lock Out-Tage Out

Picture

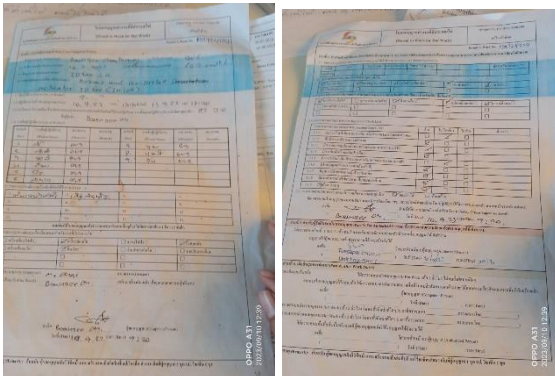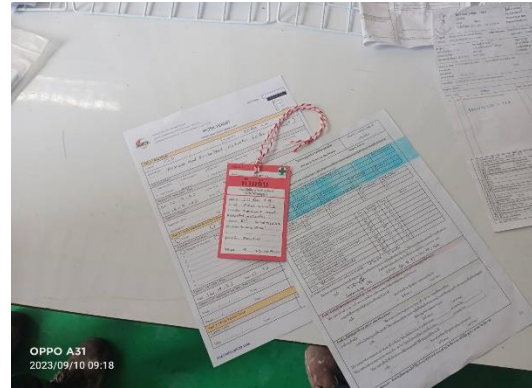

Remark:


Date: 10.9.2023

Job name: ปิด Work Order งาน Insulation Penthouse Floor7

Description:

- แจ้งปิดงานกับทาง Operator
- กั้นคฤงแจกับทาง CCR
- ปลด Tague Lock Out-Tage Out

Picture

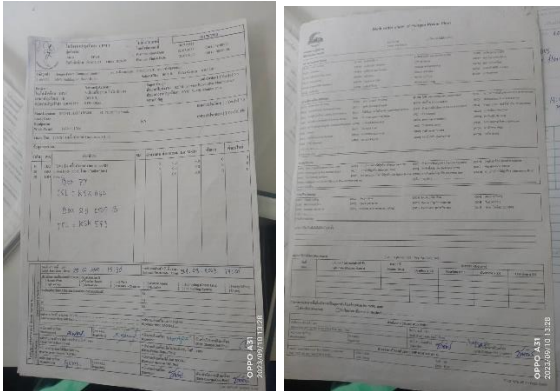

Remark:



Date: 10.9.2023

Job name: เพื่าระวังการทำงาน Installation Insulation Lagging Valve Steam Turbine Unit1 Floor2

Description:

- ปูผ้าใบก่อนเริ่มงาน
- คอยดูทีมงานให้มีความระมัดระวังห้ามทำอุปกรณ์อื่นๆเสียหาย
- ทำความสะอาดหลังเสร็จงาน

Picture

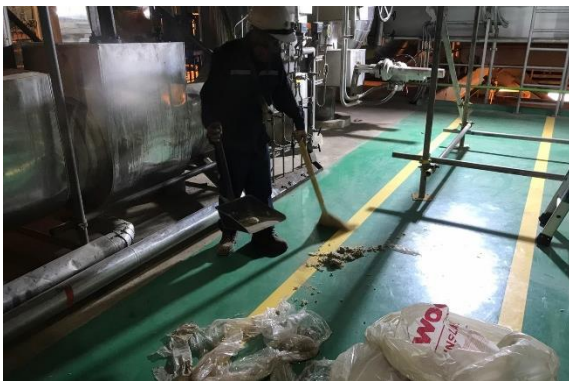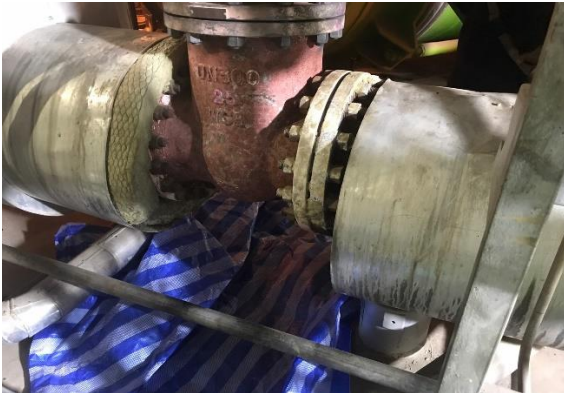

Remark:


Date: 10.9.2023

Job name: เตรียมพื้นที่งาน Actuator IDF 1A

Description:

- ให้ทีมงานมุงผ้าใบ
- ให้ทีมงานสวมใส่ Safety Full Body Harness ในการมุงผ้าใบเนื่องจากเป็นงานที่สูง
- ล้อมผ้าใบให้มีมิติชิดเพื่อไม่ให้ฝนตกโดน

Picture

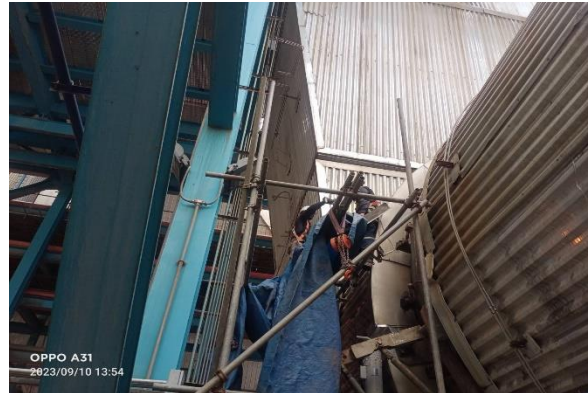

Remark:

Date: 10.9.2023
