

Job name: Daily Meeting MO Unit1 24.8.2023

Description:

1. Update ฝนฟ้าอากาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน ได้รับทราบและให้หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานกลางแจ้งเพื่อความปลอดภัย
2. Update กำหนดการงาน Plant Outage ให้ทุกท่านได้รับทราบ รายละเอียดตามรูปแบบ
3. สื่อสารเรื่อง Internal Audit ระบบ ISO 14000:2015 and 45001:2018 ให้ทุกท่านทำการ Review Risk Assessment และ จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อเตรียมตอบ Audit
4. สื่อสารเรื่องมาตรการ การเข้าปฏิบัติงานที่ห้องไฟฟ้าที่มีระบบดับเพลิง Auto mode อยู่ให้ทำการเปิด work permit at CCR เพื่อให้เจ้าของพื้นที่ปรับระบบให้ก่อนเริ่มงานทุกครั้ง
5. แจ้งให้พนักงานขับรถทุกท่านให้พกใบขับขี่รถติดตัวเพื่อพร้อมให้ทีมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบก่อนเข้าโรงไฟฟ้าด้วย
6. สื่อสารให้ทุกท่านจัดเตรียมฐานข้อมูลพนักงานเพื่อป้อนเข้าระบบ New Face Scan กำหนดส่งไม่เกินวันที่ **25/08/2023**
7. เน้นย้ำเรื่องการใช้ลิฟท์ในโรงไฟฟ้า ไม่ให้บรรทุกน้ำหนักหรือโดยสารเกิน Limit ที่โรงไฟฟ้ากำหนดไว้คือ 1,800 KG หรือ ขึ้นไม่เกิน 15 คน

Picture



HSA-T1 Major Overhaul (MO)
 Confirmed schedule, 24 Jul- 20 Sep 2023 (59 Days)

HSA-T2 Yearly Maintenance (YM)
 Confirmed schedule, 8- 29 Oct 2023 (22 Days)

HSA-T3 Major Overhaul Extended (ME)
 Confirmed schedule, 17 Dec 2023- 9 Feb 2024 (55 Days)

Generator Unit	Existing Planned Outage		New Planned Outage	
	Activity	Schedule	Activity	Schedule
Unit 2	Yearly Maintenance	17 September – 8 October 2023	Yearly Maintenance	8 – 29 October 2023
Unit 3	Yearly Maintenance	22 October – 12 November 2023	Extended Major Overhaul	17 December 2023 – 9 February 2024



Remark:

Date: 24.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน Installation Insulation Lagging Coal Pipe Fan Mill No.7

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- เน้นย้ำก่อนทำงานทุกครั้งต้องปูผ้าใบกันของตก
- เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวัง สะถานที่ทำงานบนที่สูง
- ทบทวนอันตรายในการทำงานบนที่สูงสวมใส่ Safety Full Body Harness
- เน้นย้ำทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน

Picture



Remark:

Date: 24.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน Installation Insulation Lagging ในเตา Penthouse Floor7

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงานผู้เข้าปฏิบัติงาน และ ผู้เฝ้าระวัง
- เน้นย้ำการสื่อสารกันให้ชัดเจน
- เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวัง สะถานที่ทำงานที่อับอากาศแสงสว่างต้องเพียงพอ
- ทบทวนอันตรายในการทำงานในที่อับอากาศ
- เน้นย้ำทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน

Picture



Remark:


Date: 24.8.2023

Job name: เฝ้าระวังงาน Installation Insulation Lagging Coal Pipe Fan Mill 17

Description:

- ตรวจสอบสภาพนั่งร้าน
- ให้ทีมงานปูผ้าใบก่อนเริ่มงาน
- ค่อยเฝ้าระวังงานทำงานบนที่สูงของทีมงาน
- ก้าวเตือนเมื่อเห็นการกระทำที่เป็นอันตราย
- ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

Picture

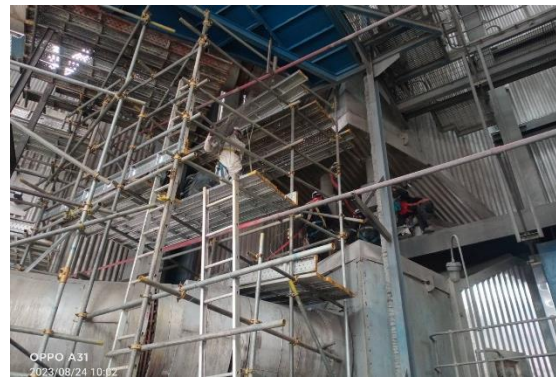

Remark:


Date: 24.8.2023

Job name: เฝ้าระวังงาน Installation Insulation Lagging HTFGD No.2 and No.7 Boiler Unit1 Floor6

Description:

- ตรวจสอบสภาพน้ํารัน
- ให้ทีมงานปูผ้าใบกันของตกก่อนเริ่มงาน
- ค่อยดูการค้องเกี่ยวระขอในการทำงานบนที่สูง
- เฝ้าระวังให้เหตุผิดปกติ และ การกระทำที่ไม่ปลอดภัย
- ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

Picture

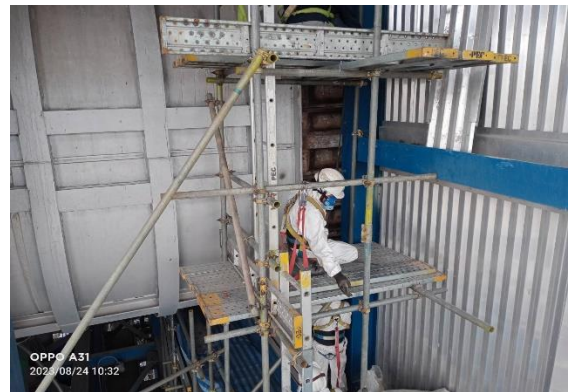

Remark:



Date: 24.8.2023

Job name : ฝ้าระวังงาน Installation Insulation ในเตา PenthoueFloor7

Description:

- ตรวจวัดสภาพอากาศ
- ทำหน้าที่ผู้ฝ้าระวังที่จุดทางเข้าออก
- ค่อยตรวจคนเข้าออก และ ให้ทีมงานลงชื่อ, เวลาเข้าออกทุกครั้ง
- ตรวจสอบแสงสว่างภายในที่ปฏิบัติงาน
- ค่อยแนะนำหากพบเห็นสิ่งที่เป็นอันตราย หรือ ไม่ปลอดภัย
- ทำความสะอาดหลังเลิกงาน

Picture

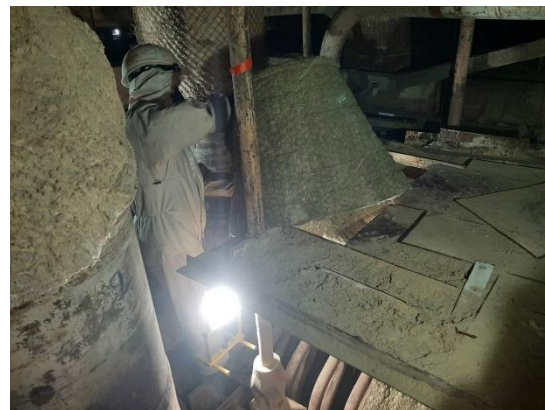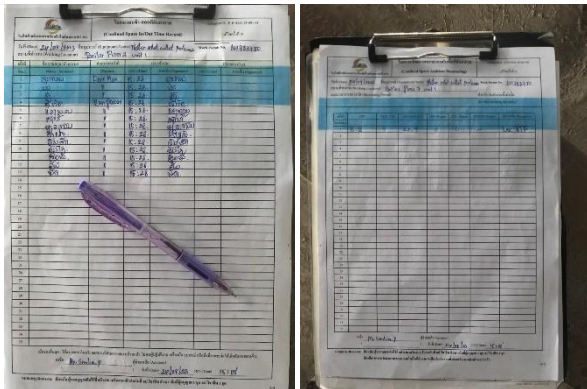

Remark:

Date: 24.8.2023
