


Job name: Daily Meeting MO Unit1 14.8.2023

Description:

- แจ้งการนำใช้ Face Scan ใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 1.9.2023
- แจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานในการทำงานที่ Boiler Unit1 Floor7
- เน้นให้บอกทีมงานในการสวมใส่ PPE ให้เหมาะสมกับงานที่ทำ
- สื่อสารการประเมินความเสี่ยงหน้างานให้มีความรัดกุม และ สิ่งเล็กน้อยไม่ให้มองข้าม
- สื่อสารการส่ง UA,UC ให้มากขึ้น และ หาช่องทางที่ง่ายในการรายงานช่วยกัน

Picture



Remark:

Date: 14.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน ในเตา Penthouse Unit1 Floor7

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- ทบทวนอันตรายในที่อับอากาศ
- เน้นย้ำผู้เฝ้าระวังให้ประจำอยู่จุดทางเข้าตลอดเวลา
- เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานต้องเซ็นชื่อเข้าออกทุกครั้ง
- แสวงหาข้อสงสัยหรือข้อผิดพลาดเพื่อการปฏิบัติงาน

Picture



Remark:

Date: 14.8.2023

Job name: Toolbox Talk and Safety Talk ก่อนเริ่มงาน Modify Aluminum Lagging Fan mill 11-18

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่แต่ละทีมงาน
- เน้นย้ำอันตรายจากพื้นที่ทำงานละวังของตกได้
- ทบทวนอันตรายจากการทำงานบนที่สูง
- เน้นย้ำให้ระมัดระวังของตก และ ให้อุปกรณ์ก่อนเริ่มงาน
- เน้นย้ำกานสวมใส่ Safety Full body harness

Picture



Remark:

Date: 14.8.2023

Job name: Toolbox talk and Safety Talk ก่อนเริ่มงาน Remove Insulation Lagging Coal pipe Boiler unit1

Description:

- ปูผ้าใบกันของตกลงข้างล่าง
- ให้ทีมงานสวมอุปกรณ์ PPE ตลอดเวลาที่ทำงานบนที่สูง
- ห้ามไม่ให้คนไม่เกี่ยวข้องของเข้าในพื้นที่ที่ทำงาน
- เผื่อระวังทีมงานในการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

Picture



Remark:

Date: 14.8.2023

Job name: ฝ้าระวังงาน Modify Aluminum Lagging Fan mill 11-18

Description:

- ร้อมบริษัคตการทํางาน และ ให้ทีมงานปูฝ้าไบกัันของตค
- ฝ้าระวัง และ คอยแนะนำทีมงานให้ค้องเก็ย Safety Full Body Harness
- ห้ามไม้ให้ทีมงาน โยนของให้กัันโดยเด็คขาด
- ฝ้าระวังทีมงานในการทํางานเพื่อไม้ให้มีอันตรายจากของตค
- ทําคความสอาศหลังเล็คงาน

Picture



Remark:

Date: 14.8.2023

Job name: เฝ้าระวังงาน เชื่อมขา Support ตู้ MOV และ ทาสีราวกันตก IDF 1A 1B

Description:

- รื้อมบริเขตการทำงาน และ ให้ทีมงานปูผ้ากันไฟ
- ให้ทีมงานสวมใส่ PPE ให้ครบถ้วน
- ห้ามไม่ให้คนไม่เกี่ยวข้องของเข้าในพื้นที่ที่ทำงาน
- เตรียมถังดับเพลิง และ เฝ้าระวังเพลิง
- ระมัดระวังอุปกรณ์ไฟฟ้า และ จัดเก็บหลังเลิกงาน
- ปูผ้าใบให้มีมิดชิด เพื่อไม่ให้สีหก และ ให้ระมัดระวัง

Picture



Remark:



Date: 14.8.2023

Job name: ฝ้าระวางงาน งาน Test ระบบ Actuator IDF 1A 1B

Description:

- รื้อมบริเขตการทำงาน และ ติดป้ายบ่งชี้งาน
- ให้ทีมงานสื่อสารกันให้มาก และ ระวังอันตรายจากงานไฟฟ้า
- ห้ามไม่ให้คนไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่ที่ทำงาน
- ประสานงานถ้าหากพบปัญหาหน้างาน

Picture

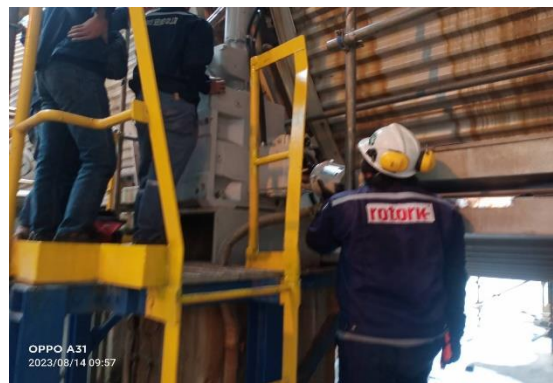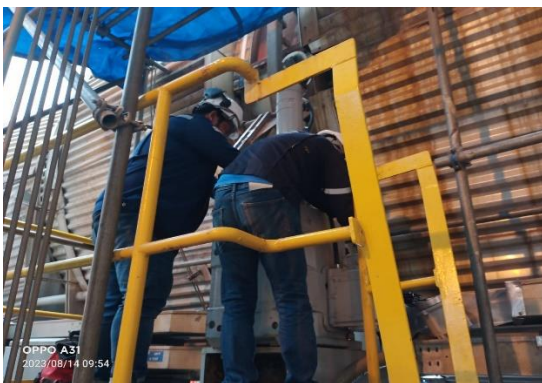

Remark:

Date: 14.8.2023

Job name: ฝ้าระงับการชน insulation ขึ้นไป Penthouse Boiler Unit1 Floor7

Description:

- คอยบอกทีมงานห้ามไม่ให้วาง Insu ขวางหน้าลิฟท์
- ไม่ให้ทีมงานใส่ Insu มากจนเกินไป
- ให้ทีมงานระมัดระวังการชน Insu ห้ามทำตก
- ค่อยประสานงานการใช้ลิฟท์กับทีมงานอื่นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

Picture



Remark:

Date: 14.8.2023

Job name: ฝึั้ระวังงาน Remove Insulation Lagging Coal Pipe Boiler Unit1

Description:

- ร็้อมบริษั้ตการท้งาน และ ให้ทีมงานปู้ฝ้าไ้กันขงตค
- ฝึั้ระวัง และ คอยแนะนำทีมงานให้ค็องเก็ย Safety Full Body Harness
- ห้ามไม้ให้ทีมงาน โยนขงให้กันโดยเด็้คขาด
- ฝึั้ระวังทีมงานในกรท้งานเพื่อไม้ให้มีอันตรายจากขงตค
- ท้งความสอาสหล้งเล็้กงาน

Picture



Remark:


Date: 14.8.2023

Job name: ฝ่้าระวังงานทำงานในที่อับอากาศ Penthouse Boiler Unit1 Floor7

Description:

- ตรวจสอบก่อนเริ่มงาน และ ดูเรื่องแสงสว่างของทีมงานต้องเพียงพอ
- ฝ่้าระวังที่จุดทางเข้าตลอดเวลา และ ค่อยตรวจทีมงานในการเข้าออก
- ให้ทีมงานเข้าชื่อ และ ลงเวลาเข้าออกทุกครั้ง
- ห้ามไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องของเข้าไปที่อับอากาศ

Picture

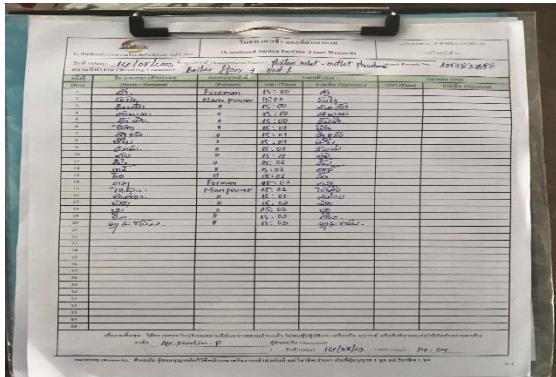

Remark:



Date: 14.8.2023

Job name: ต่ออายุ Work Permit งานที่ทำ MO T1

Description:

- ตรวจสอบใบ Work Permit งานต่างๆ วันที่ เวลา
- ปิด Work Permit ตัวเก่า กับทาง Operator
- เปิด Work Permit ตัวใหม่ กับทาง Operator

Picture

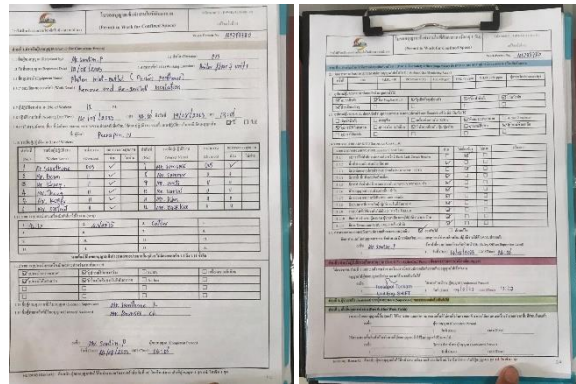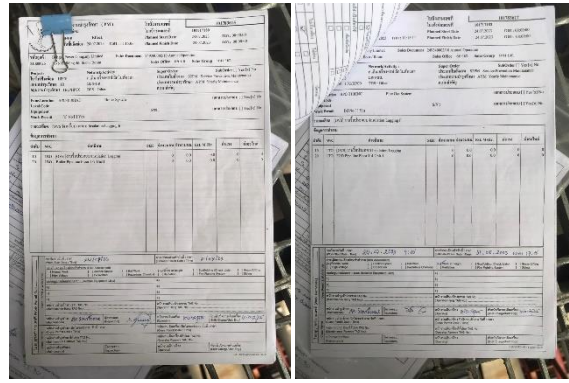

Remark:

Date: 14.8.2023
