
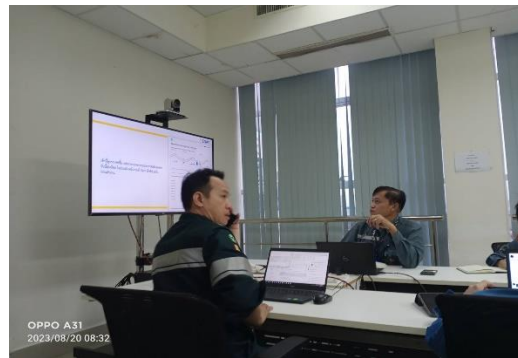


Job name: Daily Meeting MO Unit1 20.8.2023

Description:

- แจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนให้ทุกบริษัทแจ้งคนขับรถของตนเองให้เพิ่มความระมัดระวังขับขี่ตามกฎหมาย
- แจ้งข่าวเรื่อง Face Scan เพื่อให้ทุกบริษัทเข้าใจรวมกันในการจัดทำข้อมูล และ ส่งตามเวลาที่กำหนด
- แชร้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นของเหมืองแร่รถยนต์
- เน้นย้ำการส่งรายงาน UA, UC, Near Miss
- สื่อสารการขับขี่รถต้องให้มีความระมัดระวัง และ ลงตะเบ็ดทุกครั้ง
- เน้นย้ำช่วยกันแชร์ข้อมูลข่าวสารอุบัติเหตุต่างๆ ให้ถึงผู้ปฏิบัติงานรับรู้ และ รับทราบ

Picture

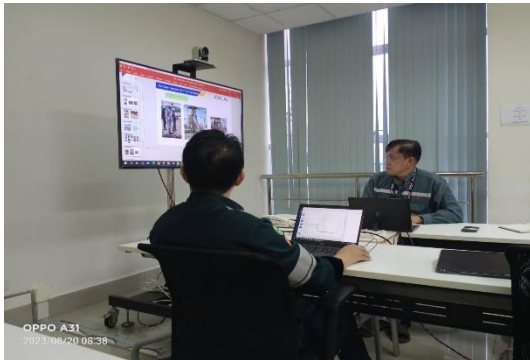

Remark:

Date: 20.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน Installation Aluminum Lagging Low Leakage Fan FGD Unit1

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- เน้นย้ำก่อนทำงานทุกครั้งต้องปูผ้าใบกันของตก
- เน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวัง สะถานที่ทำงานแคบ
- ทบทวนอันตรายในการทำงานบนที่สูงสวมใส่ Safety Full Body Harness
- เน้นย้ำทำความสะอาดทุกครั้งหลังเสร็จงาน

Picture



Remark:

Date: 20.8.2023

Job name: Toolbox talk and safety ก่อนเริ่มงาน โนเดา Penthouse Unit1 Floor7

Description:

- ทบทวนขั้นตอนการทำงาน
- แบ่งหน้าที่ของทีมงาน
- ทบทวนอันตรายในการทำงานในพื้นที่อับอากาศ
- เน้นย้ำผู้เฝ้าระวังต้องประจำที่จุดทางเข้าออกตลอดเวลา
- เน้นย้ำกานใส่อุปกรณ์ PPE ให้ครบถ้วน
- เน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานต้องเซ็นชื่อ และ ลงเวลาเข้าออกทุกครั้ง

Picture



Remark:

Date: 20.8.2023

Job name: ฝ้าระวางงาน Installation Aluminum Lagging Low Leakage Fan FGD unit1

Description:

- ล้อมบริเวณ ติดป้ายบ่งชี้งาน ไม่ให้ทีมงานอื่นผ่านบริเวณข้างล่างที่ทำงาน
- ให้ทีมงานปูผ้าใบก่อนเริ่มงานเพื่อระวางของตก
- ให้ระมัดระวังทีมงานสวมใส่ PPE ตลอดเวลา ระมัดระวังการทำงานในที่แคบ
- ห้ามไปยุ่งเกี่ยวกับอุปกรณ์อื่น และ ระวางไม่ให้ทีมงานทำอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้าเสียหาย

Picture



Remark:

Date: 19.8.2023

Job name: แจ้งวัดอากาศ ในเตา Penthouse Boiler Unit1 Floor7

Description:


- แจ้งวัดอากาศกับทาง SHE HPC
- แจ้งสถานที่, เวลา และ รอยอยู่ที่จุดปฏิบัติงาน

วันที่ 20/08/2023 ทีมงานได้มาตรวจวัดอากาศก่อนเริ่มงานและติดตามการทำงานของ One volts service อยู่ชั้น Penthouse Boiler Unit#1 เป็น งานเข้าหุ้ม insulation ช้างไน ก่อนเริ่มงานได้วัดอากาศค่าที่วัดได้คือ

- LEL = 0 %
- O2 = 20.3 %
- CO = 0 ppm
- H2S = 0 ppm

- ค่าที่วัดได้แม่นยำปกติ แม่นสามารถทำงานได้หน้างานตอนนี้แม่นยำมีปัญหาหยังเจ้า

Picture

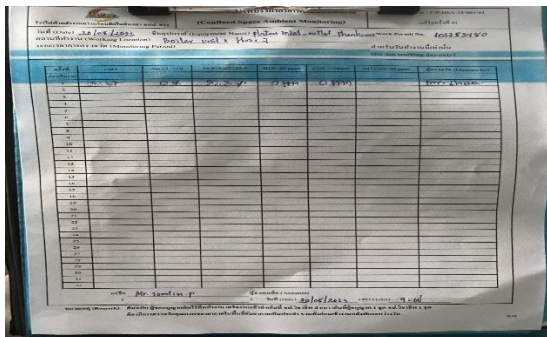

Remark:

Date: 20.8.2023

Job name: : เฝ้าระวังงาน Remove Expantion Joint Cold Gas Fan 1B Unit1

Description:

- ตรวจสอบสภาพนั่งร้านไม้ค้อยแข็งแรงให้ทีมงานเพิ่มความระมัดระวัง
- ค่อยเตือนทีมงานให้คล้องเกี่ยวสาย Safety Full Body Harness ในขณะที่ทำงานบนที่สูง
- เฝ้าระวังการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทหินเจียรให้ใส่ PPE เฉพาะงานให้คบบถ้วน
- เตรียมถังดับเพลิง และ ค่อยเฝ้าระวังไม่ให้ทีมงานไม่เกี่ยวข้องของเข้าไปในพื้นที่
- ค่อยแนะนำหากพบเห็นสิ่งที่เป็นอันตราย หรือ ไม่ปลอดภัย

Picture



Remark:

Date: 20.8.2023
